




Entwicklung des Hufeisensees – Aktueller Sachstand –



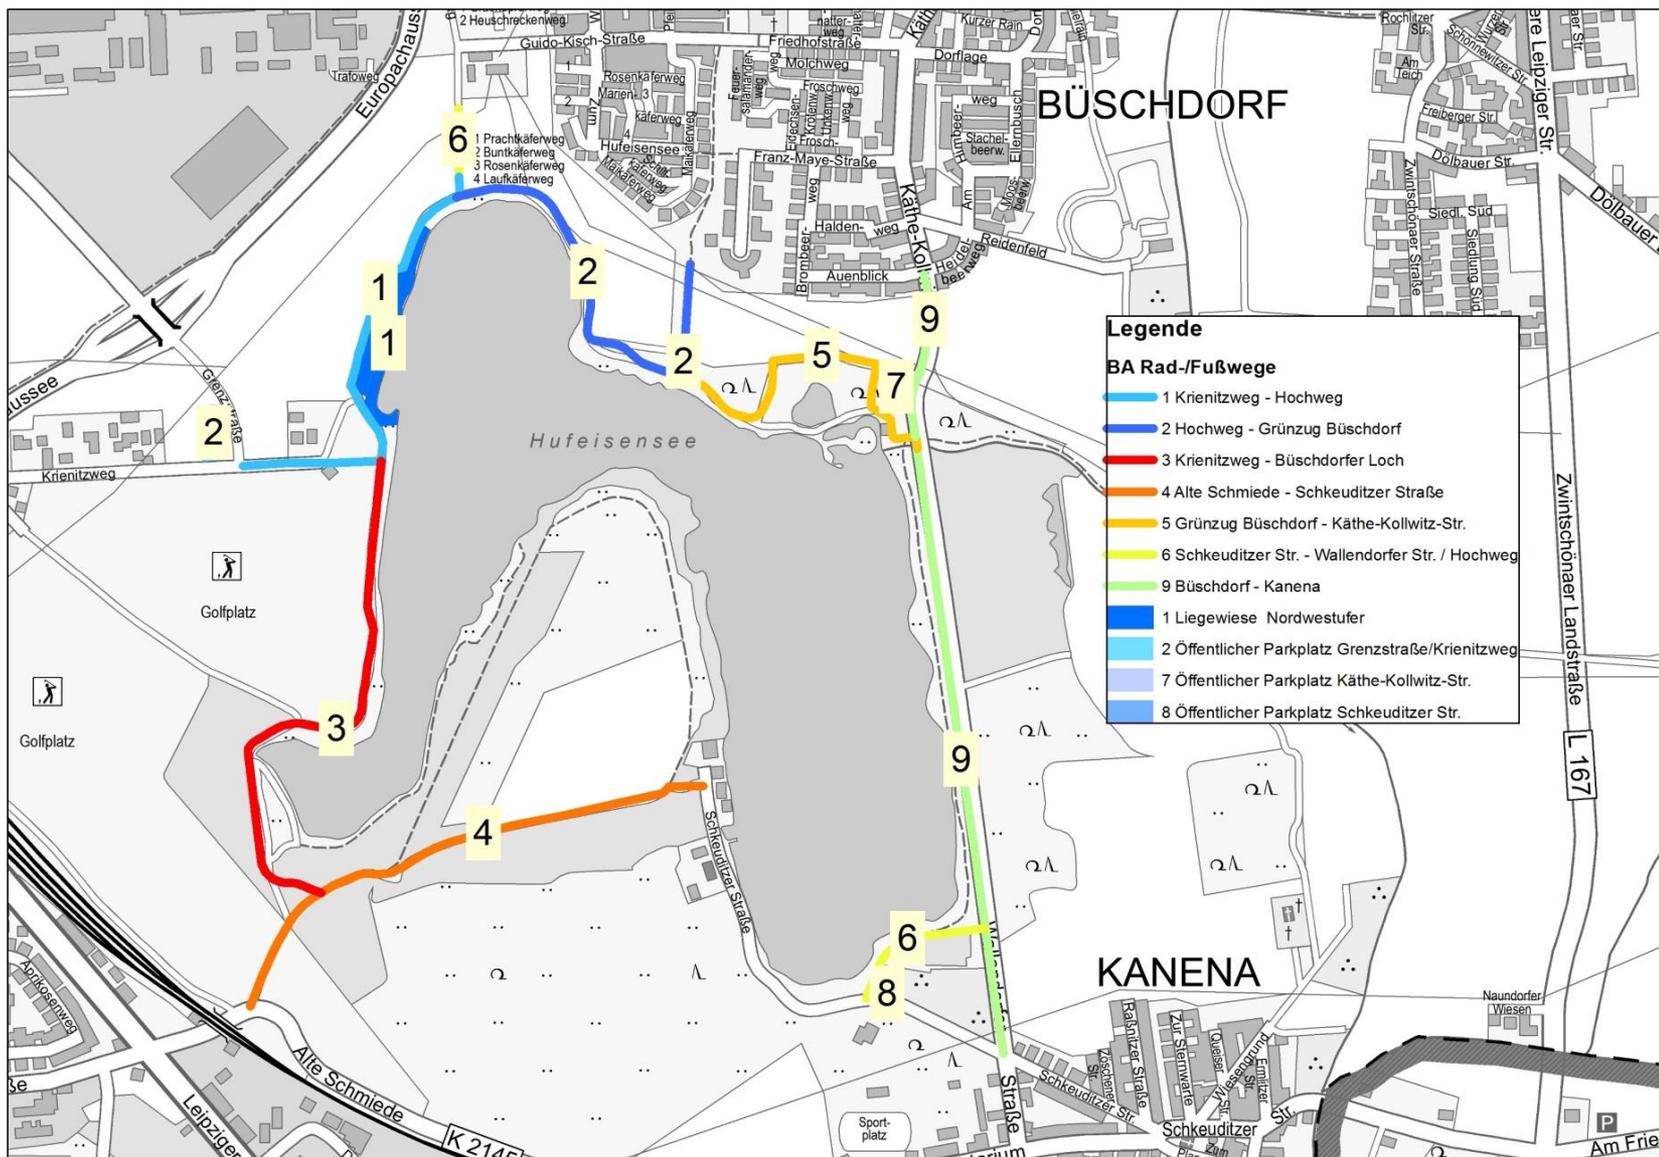

- Bauabschnitt 1 Krienitzweg – Hochweg:
Fertiggestellt im IV. Quartal 2016.
- Bauabschnitt 2.1 Hochweg – Grünzug Büschdorf u. Bauabschn. 3 Krienitzweg – Büschdorfer Loch:
Derzeit in Vergabe, Bau bis III. Quartal 2017 (geplanter Bauzeitraum 19.06.2017 bis 31.08.2017).
Im BA 3 Krienitzweg bis Büschdorfer Loch wurde Unterbau durch Golfpark Hufeisensee GmbH & Co KG bis Ende 2016 hergestellt; auf Grund des abzusehenden zeitlichen Versatzes zwischen Unterbauherstellung und Fertigstellung der Decke durch die Stadt sind im kommunalen Leistungsumfang von vornherein die abschließende Herstellung des Planums und notwendige Nachverdichtungen vorgesehen, für die Stadt entstehen dadurch keine Zusatzkosten.
- Bauabschnitt 2.2 Öffentlicher Parkplatz Grenzstraße/Krienitzweg:
Vorbereitung Ausschreibung und Vergabe Bauleistung, Baubeginn bis III. Quartal 2017
- Bauabschnitt 4 Rundweg zwischen Alte Schmiede – Büschdorfer Loch und Schkeuditzer Straße
Ausschreibungsunterlagen derzeit in Prüfung, Ausschreibung im III. Quartal 2017 und Baubeginn im IV. Quartal 2017, Fertigstellung April 2018
- Bauabschnitt 5 Rundweg zwischen Grünzug Büschdorf und Käthe-Kollwitz-Str.:
Ausschreibungsunterlagen in Erarbeitung, Baubeginn März 2018
- Bauabschnitt 6 Radweg Schkeuditzer Straße - Wallendorfer Straße + Hochweg (130 m),
Bauabschnitt 7 Öffentlicher Parkplatz Käthe-Kollwitz-Str. und Bauabschnitt 8: Öffentlicher Parkplatz Schkeuditzer Str.:
Eine Anmeldung für die Haushaltsjahre 2018-2020 ist geplant.
- Bauabschnitt 9 Radweg Büschdorf – Kanena (asphaltierter Rad-/Fußweg) (1.600 m)
Fördermittelantrag nach EFRE – Landesprogramm „Förderung nachhaltiger Mobilität – Radverkehr“ wurde im Dezember 2017 gestellt und genehmigt; Vorplanung in Vergabe, Bauabschluss bis 2020 geplant.



Bauanträge/Baugenehmigungen nach BauO LSA

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Errichtung einer 18-Loch Golfanlage nebst Übungsanlagen - Genehmigung der Fußballgolfanlage, der Driving Range (Übungsanlage für Abschläge) und des Clubsekretariats in Containerbauweise der Beachsocceranlage, einer Stellplatzanlage und einer Pumpstation | genehmigt und errichtet |
| 2. Errichtung einer Driving Range Hütte | genehmigt und errichtet |
| 3. Errichtung Clubhaus | genehmigt, Baubeginn angezeigt |
| 4. Errichtung Systemhalle für Fahrzeuge | Bauantrag derzeit in Prüfung |
| 5. Errichtung eines Ausbildungs- und Trainingszentrums für den Wasserrettungssport | Bauantrag derzeit in Prüfung |



Es sind, neben den laufenden Nutzungen durch nachfolgend aufgeführte Vereine, folgende Vorhaben bekannt oder angefragt (B), beantragt (A) oder genehmigt (G).

Am Hufeisensee etablierte Vereine:

- WSC Hufeisensee Halle e.V.
- Tauchclub Orca e.V.
- Wassersportclub Halle

neu:

- Golfpark Hufeisensee e.V.
- Wasserrettungsdienst Halle (Saale) e.V.

geplant/angefragt:

- Wake-up UG (Wakeboard)

Verein	Vorhaben/Projekt	Verfahrensstand	Bemerkung
Golfpark Hufeisensee e.V.	Errichtung Steganlage im Westteil	G	
Wake-up UG	Errichtung Wakeboard Anlage am Westufer Hufeisensee	B	Bei Vorlage der Antragsunterlagen ist Konformität zu Festsetzung B-Plan 158 zu prüfen
Wasserrettungsdienst Halle (Saale) e.V.	Errichtung Taucherische Infrastruktur im Nordwestbereich des Hufeisensees	A	Installation von Bojen auf dem See und Unterwasser-Tauch-Plattform
WSC Hufeisensee Halle e.V.	Errichtung und Betrieb einer 2. temporären Wasserkistrecke im Nordwestteil Hufeisensee	B	Hintergrund: Bundesstützpunkt i.V.m Ausrichtung von Meisterschaften (Land und Europa)



