



# **Bericht Projektstand Bauprojekte GB Stadtentwicklung und Umwelt**

**Stand: Quartal I - 2025**




## Erläuterung Bericht Projektstand

**Zielstellung:** Kurzbericht über Stand im Bau befindlicher Projekte

**Inhalt:** Wesentliche Aussagen zum generellen Umfang des Projektes einschließlich Projektzeitraum  
Vertiefte Aussagen zu Projektstand, Ausführung und Vergaben, Kosten und Einzugstermin

Visualisierung des Projektstandes/ Legende:



Keine Maßnahmen erforderlich



Maßnahmen eingeleitet, Planungsverzögerung



Maßnahmen erforderlich, Lösung noch offen



# Moritzburgring

## Förderprogramm: ASO/Lebendige Zentren


Baubeschluss: im Juni 2025

Maßnahmenbeschreibung:  
Neugestaltung der Platzfläche zwischen  
Geist- und Großer Wallstraße als Teil des Grünen  
Altstadtrings

Projektstand: Variantenbeschluss liegt vor

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 592.210 Euro  
Kostenschätzung: 517.444 – 536.513 Euro  
Bewilligung: 22.430 Euro über ASO  
Restmittel wurden im Programm Lebendige Zentren  
im PJ 2023 beantragt, aber nicht bewilligt,  
erneute Beantragung im PJ 2024 ist bereits erfolgt.

Baubeginn/-ende: 2026 (bei Bewilligung PJ 2024)





# Curie-Platz

## Förderprogramm: Lebendige Zentren

Variantenbeschluss: VII/2023/06406 im Februar 2024

### Maßnahmenbeschreibung:

Sanierung/Neugestaltung der  
Freiflächen und der  
Brunnenanlage einschl. der Wassertechnik

Projektstand: LP 3 ist beauftragt

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 2.725.700 Euro  
Kostenschätzung: 2.675.700 – 2.725.689 Euro  
Bewilligung: 0 Euro  
Fördermittel wurden im Programm Lebendige Zentren  
im PJ 2023 beantragt aber nicht bewilligt,  
erneute Beantragung im PJ 2024 ist bereits erfolgt.  
Die Vorplanung wurde über Eigenmittel vorfinanziert.

Baubeginn/-ende: Ende 2026 (bei Bewilligung PJ 2024) bis Ende 2027





# Grüne Mitte Silberhöhe

## Förderprogramm: Soziale Stadt Silberhöhe

Baubeschluss: VII/2022/04051 vom 25.01.2023


### Maßnahmenbeschreibung:

Neubau eines beleuchteten, 2,5 m breiten, asphaltierten Fuß- und Radweges zur Neuordnung der Wegebeziehungen in der Silberhöhe nach dem Rückbau von Gebäudebeständen

Projektstand: Prüfung und Vorbereitung Ausschreibung

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 417.000 Euro  
Kostenberechnung: 363.875 Euro  
Bewilligung: 417.000 Euro

Baubeginn/-ende: III. Quartal 2025 bis IV. Quartal 2025





# Wasserspiel Früchte des Meeres

## Förderprogramm: Soziale Stadt Silberhöhe

Baubeschluss: VIII/2024/00566 vom 03.03.2025

### Maßnahmenbeschreibung:

Sanierung der Freiflächen und der  
Brunnenanlage einschl. der Wassertechnik  
Sanierung und Rekonstruktion der Brunnenskulpturen

Projektstand: LP 4-6 wird gerade beauftragt

Im Zuge der Entwurfsplanung wurde ersichtlich, dass die bautechnischen und künstlerischen Anforderungen zu erheblichen Mehrkosten führen. Für die kostenintensive bauliche Realisierung und die damit verbundenen Mehrkosten für die Planungsleistungen musste eine Nachfinanzierung geregelt werden.

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 1.004.157 Euro  
Kostenberechnung: 1.004.157 Euro  
Bewilligung: 1.004.157 Euro

Baubeginn/-ende: Ende 2025 bis Ende 2026





# Wegebau Peißnitz, Birkenallee

## Förderprogramm: Soziale Stadt Neustadt

Baubeschluss: VII/2023/05404 vom 28.06.2023

### Maßnahmenbeschreibung:

Sanierung der Birkenallee und die Erneuerung der Baumallee, unter Beachtung des Altbestandes, Wiederherstellung der Querverbindung vom Verkehrsgarten zum Peißnitzhaus

Projektstand: LP 5 und 6 zur Prüfung übergeben

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 602.100 Euro  
Kostenberechnung: 602.051 Euro  
Bewilligung: 602.100 Euro

Baubeginn/-ende: Oktober 2025 bis Anfang 2026  
Baubeginn erst nach Fertigstellung Ziegelwiese und Laternenfest





# Vernetzung und Spielplatz am Bruchsee

**Förderprogramm: Soziale Stadt Neustadt**

Baubeschluss: VII/2022/04936 vom 22.02.2023


Maßnahmenbeschreibung:

Errichtung eines Spielplatzes für die Altersgruppen 6 – 12 Jahre, Sanierung Rundweg, Neupflanzungen von Bäumen und Sträuchern

Projektstand: Vergabeverfahren läuft

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 635.900 Euro  
Kostenberechnung: 635.900 Euro  
Bewilligung: 635.900 Euro

Baubeginn/-ende: III. Quartal 2025 bis I. Quartal 2026





# Spielplatz Wiener Straße

## Förderprogramm: Stadtumbau Ost

Baubeschluss: VII/2023/05097 vom 29.03.2023

### Maßnahmenbeschreibung:

Neugestaltung des Spielplatzes für die Altersgruppen 0 – 12 Jahre, Pflanzung von Bäumen und Sträuchern

Projektstand: Die Baumaßnahme wurde beauftragt und befindet sich in der Umsetzung.

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 598.884 Euro  
Kostenberechnung: 598.656 Euro  
Bewilligung: 598.884 Euro

Baubeginn/-ende: I. Quartal 2025 bis III. Quartal 2025





# Melanchthonplatz

## Förderprogramm: Stadtumbau Ost

Baubeschluss: VII/2021/03432 vom 27.04.2022

Maßnahmenbeschreibung:

Umgestaltung, Teilentsiegelung und Begrünung des Platzes,  
Neubau der Brunnenanlage und der Aufenthaltsbereiche

Projektstand:


Das erste Vergabeverfahren vom IV. Quartal 2024 wurde wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben, zweites Vergabeverfahren ist gestartet.

Finanzierungsstand:

Haushaltsansatz: 545.197 Euro  
Kostenberechnung: 545.197 Euro  
Bewilligung: 545.197 Euro

Baubeginn/-ende:

III. Quartal 2025 bis I. Quartal 2026





# Hochwasserfolgemmaßnahme HW 202 – Ziegelwiese

## Förderprogramm: Fluthilfe

Baubeschluss: VII/2022/04323 vom 26.10.2022

### Maßnahmenbeschreibung:

Sanierung der Wege auf der Ziegelwiese,  
Rückbau von Flächenversiegelungen,  
Sanierung der Peißnitzstraße, Neuverlegung  
Regenwasserkanal

Projektstand: Ausschreibung in Vorbereitung

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 1.792.000 Euro  
Kostenberechnung: 1.792.000 Euro  
Bewilligung: 1.792.000 Euro

Baubeginn/-ende: III. Quartal 2025 bis II. Quartal 2026  
unter Berücksichtigung von Großveranstaltungen





# Spielplatz Hechtgraben

## Förderprogramm: Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Baubeschluss: VIII/2024/00578 vom 03.03.2025


### Maßnahmenbeschreibung:

Errichtung eines Quartiersspielplatzes  
mit Wasserspielanlage

Projektstand: LP 4-6 wird gerade beauftragt

Finanzierungsstand: Haushaltsansatz: 862.100 Euro  
Kostenberechnung: 862.100 Euro  
Bewilligung: 862.100 Euro

Baubeginn/-ende: ab Frühjahr 2026

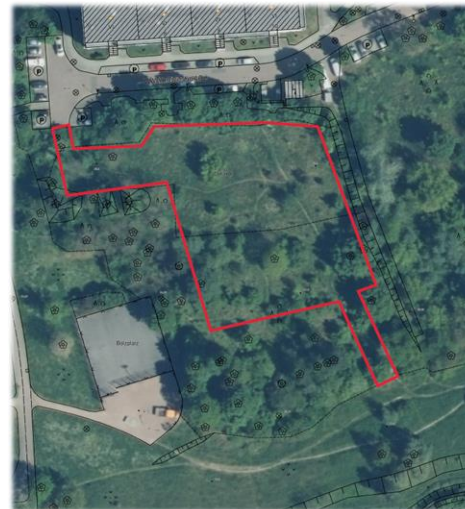




# Osendorfer See

## Projekt: Böschungssicherung und Wiederherstellung Regattastrecke

Verzicht Varianten- und Baubeschluss:	VII/2021/02685 vom 26.01.2022
Vergabe Baulos 1: Realisierung Baulos 1:	VII/2022/04746 vom 17.11.2022 Dezember 2022 bis II/2023
Vergabe Baulos 2: Realisierung Baulos 2:	VII/2023/06117 vom 22.11.2023 Dezember 2023 bis II/2025
Maßnahmenbeschreibung:	Herstellung der Baustraße und Baustelleneinrichtung, Herstellung der Böschungssicherung und Sedimententnahme zur Wiederherstellung der Regattastrecke
Projektstand:	Die Umsetzung erfolgt entsprechend vorgelegtem Bauablaufplan.
Finanzierung:	erfolgt gemäß Richtlinie Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 2013 (Bewilligungssumme: 10.036.432 Euro)





## Bushaltestellen

**Projekt:**                    **Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen – Buspaket 6**

**Baubeschluss:**            VII/2022/05014 vom 29.03.2023

**Vergaben:**                Vergabebeschluss VII/2023/05925 FB 66-B-2023-029 Paket 6.1  
Haltestellen An der Feuerwache, Dachsweg, Reideburger Landstraße  
Vergabebeschluss VIII/2024/00135 FB 66-B-2024-021  
Haltestellen Mötzlich A und B,  
Vergabe Haltestellen Karl-Pilger-Straße

**Baubeginn/-ende:**        April 2025 bis Dezember 2025 (Maßnahmen Paket 6.2)

**Maßnahmenbeschreibung:**  
Barrierefreier Ausbau mit erhöhtem Bord, taktilen Elementen ggf. Fahrgastunterstand (mind. Bank) und entsprechende Querungsstellen

**Projektstand:**            Die Maßnahmen zum Paket 6.1 sind abgeschlossen.  
Die Maßnahmen Bushaltestellen Paket 6.2 (Mötzlich und Karl-Pilger-Straße) sind ausgeschrieben und vergeben.


**Finanzierungsstand:**    Gesamtkosten gemäß Baubeschluss: 1.263.000 Euro  
Finanzierung erfolgt zu 100% aus Regionalisierungsmitteln des Landes Sachsen-Anhalt





## Quartiersplatz Thomasiusstraße/Turmstraße

<b>Projekt:</b>	<b>Erneuerung des Quartiersplatzes Thomasiusstraße/Turmstraße</b>	
Vergabebeschluss:	VII/2023/05925 FB 66-B-2023-021 vom 19.10.2023	
Baubeginn/-ende:	April bis Dezember 2024	
Maßnahmenbeschreibung:	Erneuerung Platzfläche Barrierefreie Gestaltung	
Projektstand:	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	
Finanzierungsstand:	Gesamtkosten:	554.600 Euro
	Ablösebeträge Land:	259.300 Euro





# Holzplatzbrücke BR 020-021

**Projekt:** Ersatzneubau der Holzplatzbrücke BR 020-021


Verzicht Varianten-  
und Baubeschluss: VII/2022/04748 vom 21.12.2022

Baubeginn: voraussichtlich III. Quartal 2025

Maßnahmenbeschreibung:  
Abbruch der vorhandenen Spannbetonfertigteilbrücke und  
die Herstellung des kompletten Ersatzneubau als Rahmenbauwerk

Projektstand: Beginn der Baumaßnahme erfolgt aus verkehrsorganisatorischen  
Gründen in Abhängigkeit von der Baumaßnahme Mansfelder Straße  
nach deren Verkehrsfreigabe  
Vergabeunterlagen in Prüfung  
Vergabeverfahren II. Quartal 2025, Baubeginn III. Quartal 2025

Finanzierungsstand: Gesamtkosten: 4,1 Euro  
Es handelt sich um eine FAG finanzierte Maßnahme  
(ehemals StrFinG).

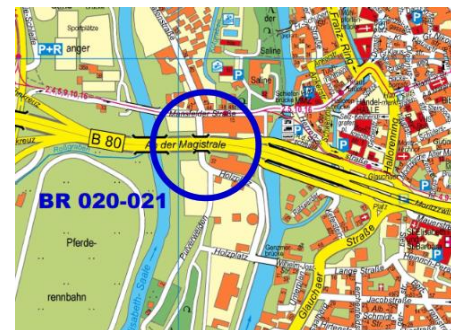



# Tunneleingang BR 101

**Projekt:** Sanierung des südlichen Tunneleinganges BR 101  
in der Silberhöhe



Verzicht Varianten-  
und Baubeschluss: VII/2022/04619 vom 21.12.2022  
VIII/2024/00319 vom 27.11.2024 (Änderung Baubeschluss)

Baubeginn: 2025

Maßnahmenbeschreibung:  
Teilabbruch des Tunnelabschnittes unterhalb der  
Freyburger Straße und der Rampenstützwände sowie  
den Ersatzneubau des Tunnels;  
Erneuerung der Beleuchtung; Tunnel wird mit  
einem farbigen Oberflächenschutzsystem versehen.

Projektstand: Vorberatung der Vergabe der Bauleistungen  
Vergabeunterlagen in Prüfung  
Vergabeverfahren II. Quartal 2025, Baubeginn III. Quartal 2025

Finanzierungsstand: Gesamtkosten: 1.595.700,00 Euro  
Fördermittel „Soziale Stadt“ in Höhe von 926.500,00 Euro

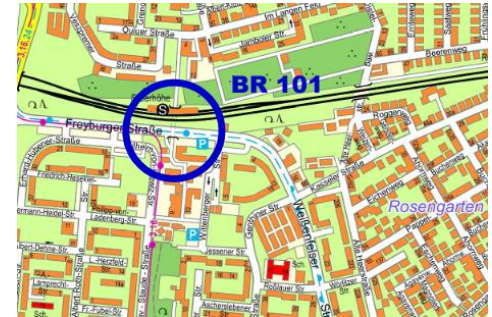



# Brücken Rennbahnkreuz

**Projekt:** Ersatzneubau der Brücke Rennbahnkreuz östlich BR 024



Verzicht Varianten- und Baubeschluss: VII/2022/04608 vom 21.12.2022

Baubeginn: voraussichtlich III. Quartal 2025

Maßnahmenbeschreibung:  
Abbruch der vorhandenen Spannbetonfertigteilebrücke und die Herstellung des kompletten Ersatzneubaus

Projektstand: Beginn der Baumaßnahme erfolgt aus verkehrsorganisatorischen Gründen in Abhängigkeit von der Baumaßnahme Mansfelder Straße nach deren Verkehrsfreigabe  
Vergabeunterlagen in Prüfung  
Vergabeverfahren II. Quartal 2025, Baubeginn III. Quartal 2025

Finanzierungsstand: Gesamtkosten: 3,6 Euro  
Es handelt sich um eine FAG finanzierte Maßnahme (ehemals StrFinG).

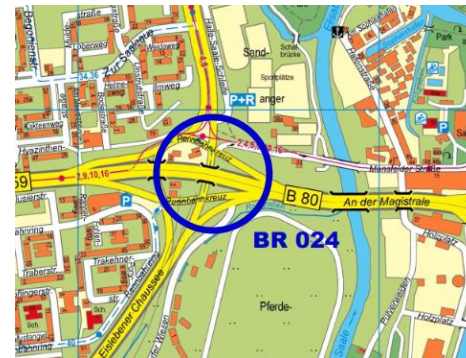



# Brücken Rennbahnkreuz

**Projekt:** Ersatzneubau der Brücke Rennbahnkreuz westlich BR 025


Verzicht Varianten- und Baubeschluss: VII/2022/04610 vom 21.12.2022

Baubeginn: voraussichtlich III. Quartal 2025

Maßnahmenbeschreibung:  
Abbruch der vorhandenen Spannbetonfertigteiltücke und die Herstellung des kompletten Ersatzneubaus

Projektstand: Beginn der Baumaßnahme erfolgt aus verkehrsorganisatorischen Gründen in Abhängigkeit von der Baumaßnahme Mansfelder Straße nach deren Verkehrsfreigabe  
Vergabeunterlagen in Prüfung  
Vergabeverfahren II. Quartal 2025, Baubeginn III. Quartal 2025

Finanzierungsstand: Gesamtkosten gemäß Baubeschluss: 3,8 Mio. Euro  
Es handelt sich um eine FAG finanzierte Maßnahme (ehemals StrFinG).





## Brücke Kinderdorf

**Projekt:** Ersatzneubau der Brücke Kinderdorf BR 114

Verzicht Varianten-  
und Baubeschluss: VII/2022/04748 vom 21.12.2022

Vergabebeschluss: VII/2023/05977 FB 66-B-2023-014 vom 25.10.2023

Baubeginn/-ende: 12.02.2024 bis 11.11.2024

Maßnahmenbeschreibung:  
Abbruch der vorhandenen Spannbetonfertigteilstückbrücke  
und die Herstellung des kompletten Ersatzneubaus

Projektstand: Die Bauleistungen wurden ausgeführt.

Finanzierungsstand: Gesamtkosten: 2.301.400 Euro  
Zuwendungen aus Sonderprogramm Stadt und Land  
2.071.260 Euro





# Kaiserslauterer Brücke

**Projekt:** Instandsetzung Kaiserslauterer Brücke (BR 092)

Verzicht Varianten-  
und Baubeschluss: VII/2022/06354 vom 20.12.2023  
VIII/2024/00091 vom 20.08.2024 (Änderung des  
Baubeschlusses vom 20.12.2023 und überplanmäßige Auszahlung)

Vergabebeschluss: VII/2024/07348 FB 66-B-2024-010 vom 22.08.2024

Baubeginn/-ende: 11/2024 bis 11/2025

Maßnahmenbeschreibung:  
Die vorhandenen Stahlbetonkragarme werden  
abgebrochen und durch Kappen ersetzt. Das  
Bauwerk wird neu abgedichtet und der Fahrbahnbelag  
erneuert.

Projektstand: Bauleistung wurden beauftragt und sind in Ausführung.

Finanzierungsstand: Gesamtkosten gemäß Beschlussfassung vom 20.08.2024  
1.193.900,00 Euro





## Hechtgrabenbrücke Waldstraßenviertel

**Projekt:** **Neubau der  
Hechtgrabenbrücke Waldstraßenviertel (BR 001)**

Variantenbeschluss: VII/2023/06290 vom 14.12.2023

Baubeginn/-ende: Baubeginn für 2025 avisiert

Maßnahmenbeschreibung:  
Neubau eines Brückenbauwerkes über den  
Hechtgraben in Heide Nord

Projektstand: in Entwurfsplanung

Finanzierungsstand: Gesamtkosten gemäß Variantenbeschluss  
ca. 550.000 Euro





# Radverkehrsanlagen Weststraße

**Projekt:** Herstellung von straßenbegleitenden Radverkehrsanlagen entlang der Weststr. zw. Göttinger Bogen/Theodor-Storm- und Kaolinstraße


**Variantenbeschluss:** VII/2023/06244 vom 22.02.2024; *Kostenschätzung: ca. 295.000 Euro*

**Baubeginn/-ende:** 2027

**Maßnahmenbeschreibung:** Lückenschluss im Radnetz angestrebt; Umwandlung eines durchgehenden Kfz-Fahrstreifens in einen Radfahrstreifen (RFS) auf ca. 400 m Länge in Fahrrichtung Süden; durchgängige zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h; Erneuerung der Steuerteile sowie Anpassung der Signalprogramme an den LSA Göttinger Bogen und Fontanestraße

**Projektstand:** Vergabe des Planungsauftrages LP 3-6

**Finanzierungsstand:** Gesamtkosten gemäß Variantenbeschluss: ca. 295.000 Euro

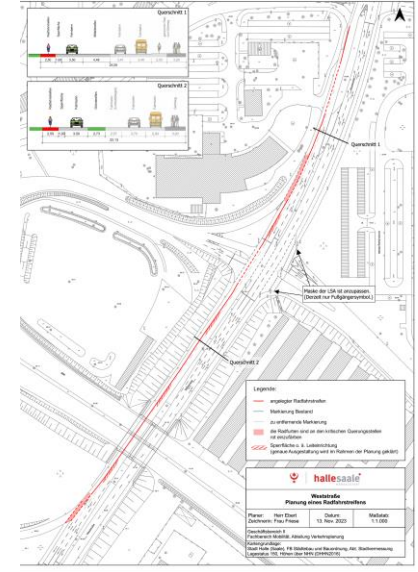

# Gehweg Heinrich-Schütz-Straße

**Projekt:** Gehweg Heinrich-Schütz-Straße

Variantenbeschluss: VII/2023/05901 vom 22.02.2024

Baubeginn/-ende: voraussichtlich 2026

Maßnahmenbeschreibung:


Herstellung eines befestigten Gehweges auf der Nordseite der Heinrich-Schütz-Straße;  
Verbreiterung des Grünstreifens mit Baumbestand und Neupflanzungen zwischen Gehweg und Fahrbahn

Projektstand: Entwurfsplanung in Bearbeitung

Finanzierungsstand: Gesamtkosten gemäß Variantenbeschluss 250.000 Euro  
(Finanzierung aus Städtebaufördermitteln in Form von sanierungsbedingten Einnahmen, hier Grundstücksverkaufserlöse – Programm Altindustriestandorte)



**hallesaale**  
HÄNDELSTADT





# Radverkehrsanlage in der Seebener Straße

**Projekt:** Umgestaltung der westlichen Radverkehrsanlage in der Seebener Straße zwischen Mötzlicher und Trothaer Straße und des Radweges von der Kreuzung Trothaer Straße bis Am Krähenberg


**Variantenbeschluss:** VII/2024/06789 vom 24.04.2024

**Baubeginn/-ende:** voraussichtlich 2026 bis Mitte 2027

**Maßnahmenbeschreibung:**  
grundhafter Ausbau des Radweges mit visueller und taktiler Trennung zum Gehweg;  
Bau einer neuen Beleuchtungsanlage im Rad-/ Gehwegbereich

**Projektstand:** VgV-Verfahren abgeschlossen

**Finanzierungsstand:** Gesamtkosten gemäß Variantenbeschluss 2,4 Mio. Euro  
Finanzierung mit Zuwendungen (Förderquote 90%) aus dem Förderprogramm nachhaltige, multimodale Mobilität in den Städten und ihrem Pendelraum im Rahmen des EFRE/LTF-Programm 2021-2027 (EFRE-RL Mobilität)

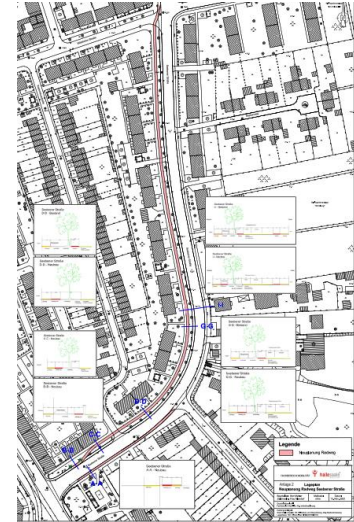

# Gehweg Turmstraße

**Projekt:** Lückenschluss östlicher Gehweg

Variantenbeschluss: VII/2024/06795 vom 13.06.2024  
Kosten: 401.800 Euro

Baubeginn/-ende: voraussichtlich 2027


Maßnahmenbeschreibung:  
Neubau eines regelwerkkonformen Gehweges mit  
anliegendem, halbseitigen Parkstreifen

Projektstand: Entwurfsplanung in Bearbeitung

Finanzierungsstand: Gesamtkosten gemäß Variantenbeschluss  
ca. 400 TEUR  
Finanzierung erfolgt aus dem Programm Wachstum  
und nachhaltige Erneuerung



**hallesaale**  
HÄNDELSTADT

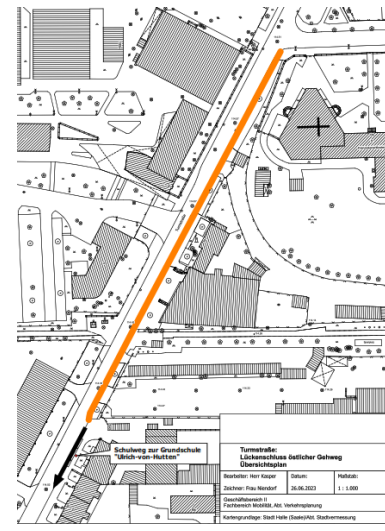

# Rathausstraße



## Projekt: Ausbau Rathausstraße

Variantenbeschluss: VII/2021/02978 vom 27.04.2022  
Baubeschluss VII/2024/07010 vom 28.08.2024  
Kosten: 1.813.000 Euro

Baubeginn/-ende: voraussichtlich: IV/2025

### Maßnahmenbeschreibung:

Grundhafter Ausbau der Fahrbahn, Gehwege und Bordanlagen;  
Erneuerung der Entwässerungseinrichtungen, Straßenbeleuchtung und Beschilderung;  
Verlegung Fernwärme;  
Erneuerung Kanal und Leitungen

Projektstand: Ausführungsplanung, LPH 5

Finanzierungsstand: Gesamtkosten gemäß Baubeschluss 1.813.000 Euro  
Finanzierung aus sanierungsbedingten Einnahmen  
(Förderung von städtebaulicher Sanierungs- und



Entwicklungsmaßnahmen „Historischer Altstädten“)



# Radweg Nietlebener Straße

**Projekt:** Ausbau des Radweges Nietlebener Straße inkl. Umbau des Knotenpunktes Eislebener Straße/Hallesche Straße im Anschlussbereich

Variantenbeschluss: VII/2023/06232 vom 28.08.2024

Baubeginn/-ende: voraussichtlich ab 2026

Maßnahmenbeschreibung:


Ausbau der Radwege in beide Fahrrichtungen,  
Freimachung des Radweges von Hindernissen wie Laternen- und Lichtsignalanlagenmasten,  
Neugestaltung des Knotenpunktes Eislebener Str./ Hallesche Str. zur Reduzierung der Konfliktpunkte und zur sicheren Führung des Radverkehrs vor und hinter der Kreuzungssituation

Projektstand: laufendes VgV-Verfahren zur Auswahl eines Planungsbüros

Finanzierungsstand: Gesamtkosten gemäß Variantenbeschluss  
ca. 3,3 Mio. Euro



**hallesaale**  
HÄNDELSTADT



# Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinbergweg



**Projekt:** Umgestaltung des Verkehrsknotens Ernst-Grube-Str./Weinbergweg als Kreisverkehr

Verzicht Varianten  
Beschluss/Baubeschluss:

VIII/2024/00203 vom 30.10.2024  
Kosten: 3.773.800 Euro

Baubeginn/-ende:

01 bis 12/2027

Maßnahmenbeschreibung:

Der vorhandene Knotenpunkt soll als Kreisverkehr ausgebaut werden.

Projektstand:

Die Vergabe der Planungsleistungen ist erfolgt.  
Planungen haben begonnen.

Finanzierungsstand:

Gesamtkosten gemäß Baubeschluss  
ca. 3.773.800 Euro



# Brücke zum Kanal (BR 111)



**Projekt:** Ersatzneubau der Brücke zum Kanal (BR 111)

**Variantenbeschluss:** VIII/2024/00525 vom 29.01.2025

**Bauausführung:** 2026/2027, in Abhängigkeit von Fertigstellung Ersatzneubau der Brücken Rennbahnkreuz

**Maßnahmenbeschreibung:**  
Die Ausführung der Brücke erfolgt als Verbundbrücke VFT-WiB®-Rahmen.

**Projektstand:** Entwurfsplanung

**Finanzierungsstand:** Gesamtkosten gemäß Variantenbeschluss ca. 3,4 Mio. Euro

