



# Flutprojekte des FB Sport

Sportausschusssitzung am 13. November 2019

## Maßnahme:

- Ersatzneubau mit Aufständering
- Sanierung Bootshalle
- Gründung Mittelbau

**Baubeginn:** IV. Quartal 2021

**Fertigstellung:** IV. Quartal 2022

**Kosten:** 843.757 € (Stand 2017),  
davon Zuwendung 819.990 € (IB, Rest sind Spenden)

## Stand der Maßnahme:

- Abstimmungen mit Verein laufen



## Maßnahme:

- Ersatzneubau Platzmeisterhaus
- Sanierung Sanitärgebäude
- Wiederherstellung Terrasse

**Baubeginn:** Mai 2017

**Fertigstellung:** Dezember 2019

**Kosten:** 480.851 €, davon bisher Zuwendung 394.271 € (IB, Rest sind Spenden)

## Stand der Maßnahme:

- Restarbeiten am Platzmeisterhaus
- Erhöhungsantrag auf Gesamtzuwendung i.H.v. 410.808 € im Oktober 2019 eingereicht



# Turnhalle am Steg



## Maßnahme:

- Ersatzneubau für Nebenhallen Eissport an anderem Standort

**Baubeginn:** September 2017


**Fertigstellung:** Mai 2019 (Bau)

II. Quartal 2020 (Ersatzpflanzung)

**Kosten:** 5.015.680 €, davon Zuwendung 4.917.680 €  
(98.000 € Eigenmittel Ausstattung)

## Stand der Maßnahme:

- Baumaßnahme abgeschlossen, Ersatzpflanzung 2020

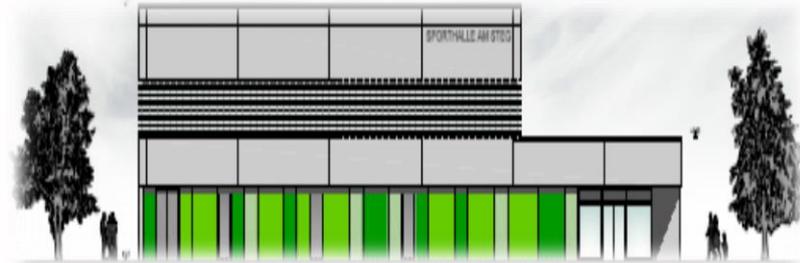

# Ausbau Eisdome



## Maßnahme:

- Erhöhung der Zuschauerkapazität auf 3.300
- Einbau fester Kabinen, WCs, Einrichtungen fürs Catering, technischer Anlagen und Lüftung
- Schaffung von 256 Parkplätzen und 180 Fahrradständern

**Baubeginn:** März 2014 - Eisdome

II. Quartal 2021 - Ausbau

**Fertigstellung Gebäude:** II. Quartal 2023

**Kosten:** 18.403.657 € netto (für Bau und Ausbau des Eisdoms),  
Zuwendungsbescheid i.H.v. 18.403.657 €

## Stand der Maßnahme:

- Planungsprozess für Ausbaumaßnahme läuft



# Wassersportzentrum Osendorfer See



## Maßnahme:

- Neubau der Vereinshäuser (HKC und Drachenbootverein)
- Sanierung der Freianlagen

**Baubeginn:** April 2018

**Fertigstellung Gebäude:** IV. Quartal 2019

**Fertigstellung Freianlage:** III. Quartal 2020

**Kosten:** 6.076.419 € (2.861.657 € LVwA; 3.214.761 € IB)

## Stand der Maßnahme:

- Richtfest für Vereinsheim Drachenbootverein 29.08.2018
- Richtfest für Vereinsheim HKC 19.07.2019



## Maßnahme:

- Ersatzneubau an anderem Standort – Kreuzvorwerk
- Abbruch am Kirchteich

**Baubeginn:** II. Quartal 2020

**Fertigstellung:** IV. Quartal 2020

**Kosten:** 389.217 € (Stand 2018),  
davon bisher Zuwendung 271.887 €



## Stand der Maßnahme:

- Abbruch am Kirchteich abgeschlossen
- Planungsprozess läuft

## Maßnahme:

- Sanierung des Tribünengebäudes
- Neubau der Wettannahmeschalter (Totalisatoren)
- Sanierung der Stallgebäude und des Geläufs
- Wiederherstellung der Freianlagen



**Baubeginn:** I. Quartal 2016

**Fertigstellung für Rennbetrieb:** Oktober 2019, Wiederherstellung aller Freianlagen bis Ende 2020

**Kosten:** 12.765.910 €, davon bisherige Zuwendung 10.965.910 € (Änderungsantrag ist gestellt)

## Stand der Maßnahme:

- Erster Renntag mit mehr als 8.000 Zuschauern am 31.10.2019
- Planung Freianlagen läuft, Ausschreibung im Frühjahr 2020

# Neubau Nachwuchsleistungszentrum



## Maßnahme:

- Ersatzneubau am neuen Standort für das Nachwuchsleistungszentrum am Sandanger
- Bau von 5 Groß- und 2 Kleinfeldern

**Baubeginn:** II. Quartal 2020

**Fertigstellung:** II. Quartal 2022

**Kosten:** 11.285.379 €

(Zuwendung i.H.v. 11.285.379 €)

## Stand der Maßnahme:

- Baugenehmigung für Freianlagen wurde eingereicht
- Baugenehmigung für Gebäude wird erarbeitet



# Uferbefestigung HRV Böllberg/Nelson



## Maßnahme:

- Wiederherstellung der Ufermauer und deren Zuwegung

**Baubeginn:** III. Quartal 2020

**Fertigstellung:** IV. Quartal 2020

**Kosten:** 565.159 €

(Zuwendung i.H.v. 565.159 €)



## Stand der Maßnahme:

- Planung ist beauftragt, Ausschreibungen II. Quartal 2020

# Ruderkanal



## Maßnahme:

- Ersatzneubau auf Gelände
- Trafostation
- Sanierung Bootshalle und Benzinlager

**Baubeginn:** Mai 2019

**Fertigstellung:** III. Quartal 2020



**Kosten:** 1.055.753 € (Zuwendungsbescheid i.H.v. 985.744 €, Erhöhungsantrag auf Gesamtzuwendung i.H.v. 1.055.753 € im Oktober 2019 gestellt)

## Stand der Maßnahme:

- Bauausführung läuft
- Brand im abzureißenden Bestandsgebäude
- Container als Übergangslösung
